Hochschule für
Technik und Wirtechaft
des Saarlandes
University of
Applied Sciences

FÖRDERVEREIN DFHI
LES AMIS DE L'ISFATES

Exkursion nach Trapani

15.06. – 19.06.2026

Projektmanagement 2 (DFIM-406)

Sommersemester 2026



Guerlain Gaupp, Irène Moguo, Michelle Nachtigall,
Jeanne Obringer, Miriame Pedro, Alessandro Pereira

Betreuender Dozent: Prof. Dr. Günter Pochmann

Abgabedatum: 22.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
2 Vorbereitung 2
2.1 Grobe Zeitleiste 2
2.2 Teilnehmer 6
3 Casa Vacanze Fardella 6
4 Durchführung 7
4.1 Montag, 15.06.2026: Anreise (Trapani) 7
4.2 Dienstag, 16.06.2026: Salzunternehmen, Weingut / Erice 10
4.3 Mittwoch, 17.06.2026: Exkursion nach Palermo (Palazzo dei Normanni) 15
4.4 Donnerstag, 18.06.2026 18
4.5 Freitag, 19.06.2026 21
5 Nachbereitung 24
5.1 Umfrage mit Bewertung 24
5.2 Erkenntnisse für die Projektgruppe 26
a. Interne und externe Kommunikation 26
b. Logistische Herausforderungen der Standortwahl 27
c. Budgetierung und Kostenplanung 27
5.3 Finanzielle Übersicht 27
a. Vorgaben der Hochschule 27
b. Im Voraus geleistete Zahlung 28
c. Restzahlung 28
d. Kostenaufteilung 28
6 Schlusswort 30

1 Einleitung

Im Sommersemester 2026 hatten wir die Möglichkeit, im Rahmen des Moduls „Projektmanagement 2 – Exkursion (DFIM-406)" eine eigene Exkursion für die Studierenden des DFHI/ISFATES zu organisieren. Für uns als Projektgruppe war dies eine besondere Gelegenheit, die im Studium vermittelten Methoden und Inhalte des Projektmanagements in einem konkreten, selbstständig organisierten Projekt praktisch anzuwenden.

Von Anfang an war es uns wichtig, eine Exkursion zu gestalten, die sowohl den Erwartungen der Teilnehmenden als auch den Anforderungen des Studiengangs gerecht wird. Dabei wollten wir nicht einfach die Konzepte der vergangenen Jahre übernehmen, sondern eigene Ideen einbringen und das Programm nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten. Gleichzeitig konnten wir von den Erfahrungen der vorherigen Projektgruppen profitieren und uns an deren Berichten orientieren.

Als Reiseziel wurde schließlich Trapani auf Sizilien ausgewählt. Die Stadt und die Region boten uns die Möglichkeit, kulturelle Aktivitäten mit wirtschaftlich relevanten Einblicken zu verbinden. Besonders die Bedeutung der Salz- und Weinwirtschaft sowie die geplanten Unternehmensbesuche vor Ort passten dabei gut zu unserem Studiengang.

Der vorliegende Bericht beschreibt unsere Exkursion von der Vorbereitung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung. Dabei soll nicht nur das entstandene Programm dokumentiert werden, sondern auch unser Vorgehen als Projektgruppe nachvollziehbar bleiben. Neben den organisatorischen Entscheidungen betrachten wir daher auch unsere Erfahrungen während der Planung, die Durchführung der einzelnen Programmpunkte, die Rückmeldungen der Teilnehmenden sowie die finanziellen und organisatorischen Erkenntnisse aus dem Projekt.


Für uns war die Exkursion nach Trapani damit nicht nur eine gemeinsame Reise, sondern vor allem ein Projekt, bei dem wir Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und die im Studium erlernten Methoden unter realen Bedingungen anwenden konnten.


2 Vorbereitung

2.1 Grobe Zeitleiste

Die Vorbereitung unserer Exkursion an der HTW begann am 4. April 2026 mit der ersten Ankündigung des Projekts in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe der DFHI/ISFA-TES-Studierenden. Jedoch wurde schon während den Semesterferien intern mögliche Reiseziele herausgearbeitet. Von Anfang an wollten wir die Studierenden in die Entscheidung einbeziehen und bereiteten dafür ein Dokument vor, in dem die verschiedenen Reiseziele vorgestellt wurden. Zusätzlich stellten wir ein Google-Dokument zur Verfügung, in dem die Studierenden ihre erste und zweite Wahl angeben konnten. So konnten wir bereits zu Beginn des Projekts die Präferenzen der Gruppe berücksichtigen und gleichzeitig eine erste Grundlage für die weitere Planung schaffen.

Um die Präferenzen der Studierenden demokratisch und bedürfnisorientiert einzubinden, führten wir vom 04. April bis 07. April eine digitale Umfrage durch. Am 11. April veröffentlichten wir die Ergebnisse der Abstimmung in der Gruppe. Bei der ersten Wahl erhielt Trapani 20 Stimmen, gefolgt von Mallorca mit 14 und Wien mit 9 Stimmen. Auch bei der zweiten Wahl lag Trapani mit 17 Stimmen vorne, während Mallorca 16 und Wien 8 Stimmen erhielten. Damit setzte sich Trapani als bevorzugtes Reiseziel durch.

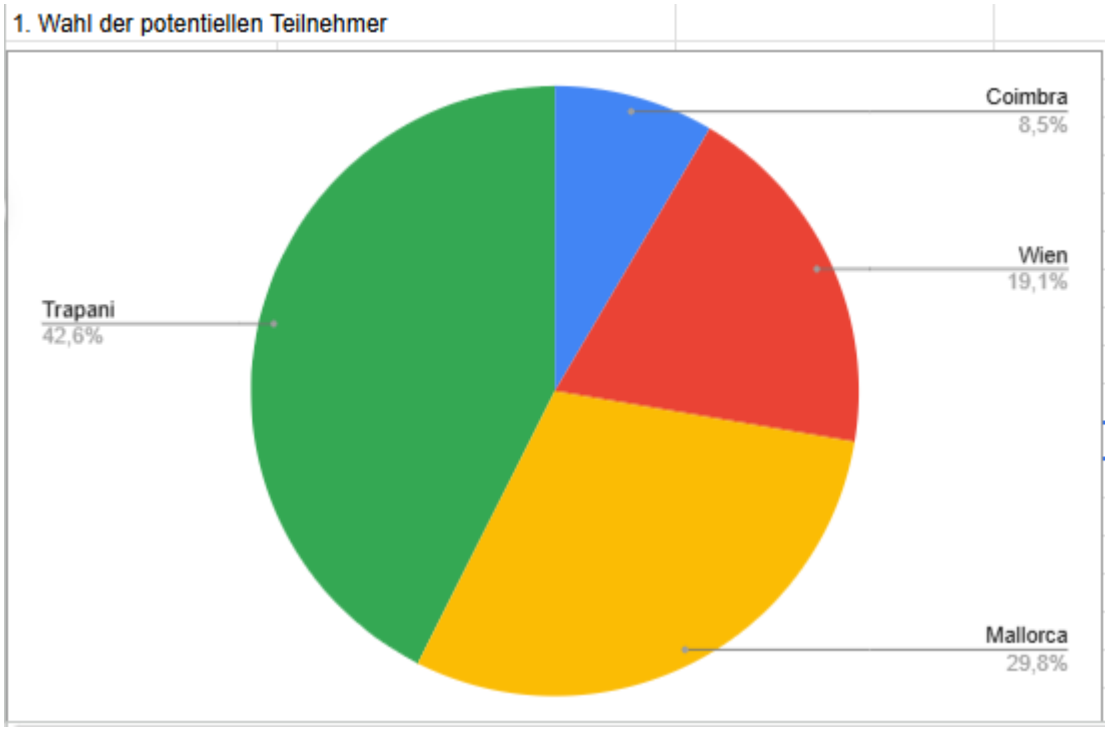

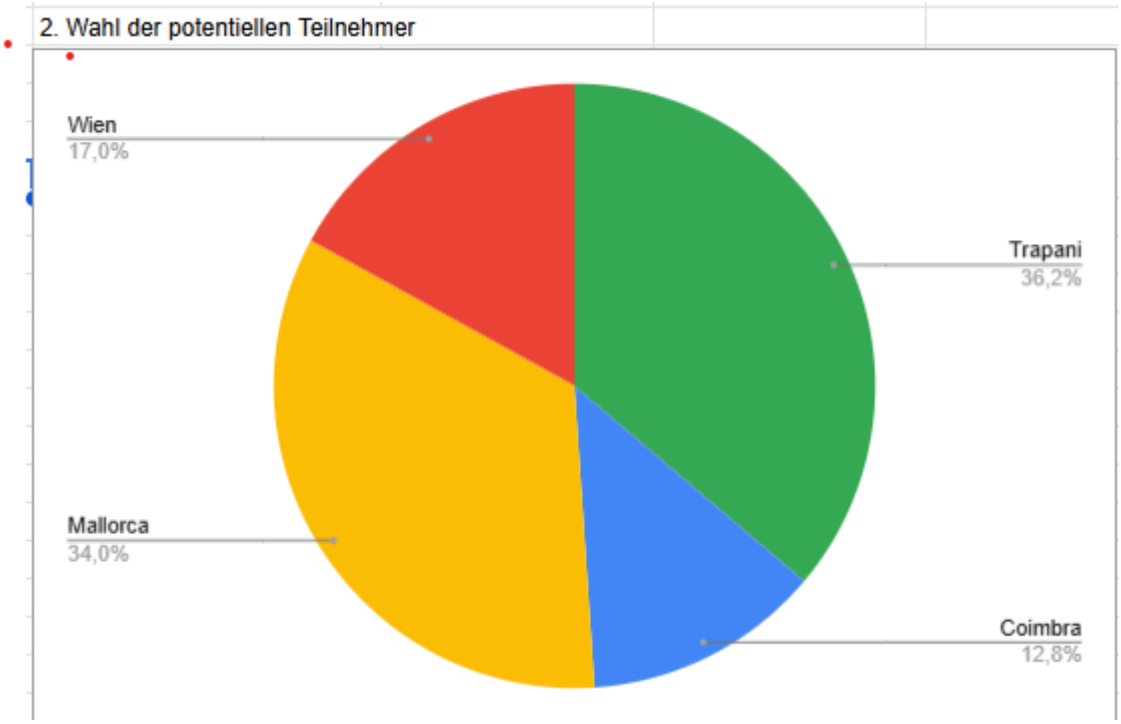

Direkt im Anschluss führten wir eine weitere Umfrage durch, um das grundsätzliche Interesse an einer Teilnahme zu erfassen. Dabei gaben 34 Studierende an, grundsätzlich teilnehmen zu wollen. Da die Exkursion von Anfang an auf maximal 30 Studierende ausgelegt war, stimmten wir uns parallel mit unserem betreuenden Professor über den organisatorischen Rahmen und die vorgesehene Teilnehmerzahl ab, bevor wir die verbindliche Anmeldung öffneten. Letztendlich meldeten sich genau 30 Studierende verbindlich an, sodass die vorgesehene Höchstzahl vollständig ausgeschöpft wurde.

Nachdem das Reiseziel feststand, wollten wir auch die Vorstellungen der Studierenden zum späteren Programm berücksichtigen. Am 14. April veröffentlichten wir dazu eine weitere Umfrage, in der die Studierenden angeben konnten, welche Aktivitäten sie sich für Trapani wünschten. Die Ergebnisse dienten uns als Orientierung für die weitere Programmplanung. Gleichzeitig begannen wir mit der Recherche nach möglichen Aktivitäten – wobei uns wichtig war, das Programm nicht rein touristisch auszurichten, sondern auch einen

Bezug zu unserem Studiengang herzustellen. Deshalb beschäftigten wir uns unter anderem mit regionalen Unternehmen und Wirtschaftszweigen, die für unser Studium relevant waren.

Parallel dazu konzentrierten wir uns zunächst auf Flug und Unterkunft, die beiden für die Durchführung wichtigsten Punkte. Ohne eine gesicherte An- und Abreise sowie eine passende Unterkunft wäre die weitere Planung kaum möglich gewesen; zudem machten beide Posten einen wesentlichen Teil des Gesamtbudgets aus und waren die Kostenpunkte, bei denen sich Preise und Verfügbarkeiten am stärksten verändern konnten.

Für die Anreise entschieden wir uns für die Direktverbindung von Saarbrücken nach Trapani mit Ryanair. Nachdem wir die Flugverbindung geprüft und die Buchungsmöglichkeiten für die Gruppe geklärt hatten, buchten wir die Flugtickets am 5. Mai 2026. Die tatsächlichen Flugkosten für die Gruppe beliefen sich auf 6.510,00 €.

Auch bei der Unterkunft wollten wir früh eine sichere Lösung haben, ohne dass eine kurzfristige Änderung einer einzigen Reservierung die gesamte Planung gefährden konnte. Deshalb reservierten wir zunächst zwei Unterkünfte parallel: die zentral gelegene Casa Vacanze Fardella Centrale sowie das etwas außerhalb von Trapani gelegene Agriturismo Duca di Castelmonte. Nachdem wir beide Optionen verglichen und die weiteren Rahmenbedingungen geklärt hatten, entschieden wir uns für die Casa Vacanze – ausschlaggebend war vor allem die zentrale Lage, durch die viele Wege zu Fuß zurückgelegt und zusätzliche Transfers vermieden werden konnten. Sie wurde schließlich für 30 Studierende in neun Wohneinheiten vom 15. bis zum 19. Juni 2026 reserviert, zum Preis von 4.920,00 € zuzüglich 360,00 € Kurtaxe. Entscheidend war für uns zunächst, die Unterkunft für die gesamte Gruppe verbindlich zu sichern; die endgültige finanzielle Abwicklung erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen.

Nachdem Flug und Unterkunft organisiert waren, konnten wir die weiteren Programmpunkte schrittweise konkretisieren. Mit den Salinen von Trapani nahmen wir bereits am 17. April erstmals per E-Mail Kontakt auf. Die Reservierung erfolgte im Voraus und wurde am 19. Mai bestätigt, die Bezahlung war jedoch erst vor Ort vorgesehen. Auch mit dem Weingut Cantine Florio nahmen wir früh Kontakt auf – der erste Austausch fand am 20. April statt – und reservierten den Besuch nach demselben Prinzip. So konnten wir wichtige Programmpunkte frühzeitig sichern, ohne die jeweiligen Kosten bereits bei der Reservierung vollständig begleichen zu müssen.

Auch die weiteren Aktivitäten und notwendigen Transporte organisierten wir nach und nach, sobald Teilnehmerzahl und Rahmenbedingungen ausreichend klar waren. Dabei

mussten wir unter anderem die Kapazitäten der verschiedenen Anbieter berücksichtigen und Termine, Verfügbarkeiten, Transportmöglichkeiten und Kosten miteinander abstimmen, bevor die einzelnen Punkte in das Gesamtprogramm einfließen konnten.

Parallel zu den Reservierungen wurde das Programm immer weiter konkretisiert und die damit verbundenen Kosten laufend neu berechnet – zu Beginn konnten viele Ausgaben nur geschätzt werden, da noch nicht alle Programmpunkte feststanden. Mit jeder bestätigten Reservierung konnten wir die Kalkulation weiter präzisieren. Am 28. April 2026 forderten wir die erste Zahlung der Teilnehmenden in Höhe von 185,00 € pro Person an; nachdem das Programm vollständig ausgearbeitet und die Kosten abschließend berechnet waren, legten wir die noch ausstehende Restzahlung von 65,00 € pro Person fest.

Am 23. April 2026 reichten wir außerdem den offiziellen Exkursionsantrag bei der htw saar ein. In den folgenden Wochen konzentrierten wir uns darauf, die bereits getroffenen Entscheidungen abzusichern und die noch offenen organisatorischen Punkte abzuschließen – von der Kommunikation mit den Teilnehmenden über die Abstimmung mit den Anbietern bis zur Organisation der Transfers und der Zimmerverteilung.

Die Vorbereitung entwickelte sich somit Schritt für Schritt von einer ersten gemeinsamen Entscheidung über das Reiseziel zu einem konkret geplanten Reiseprogramm. Durch die frühe Einbindung der Studierenden, die Begrenzung der Teilnehmerzahl auf die vorgesehenen 30 Plätze, die frühzeitige Sicherung von Flug und Unterkunft sowie die schrittweise Reservierung der Programmpunkte konnten wir die Exkursion nach und nach organisatorisch und finanziell absichern. Die einzelnen Aktivitäten selbst werden im weiteren Verlauf des Berichts noch genauer vorgestellt.

2.2 Teilnehmer

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, war die Exkursion von Anfang an auf maximal 30 Studierende ausgelegt. Von den 34 Studierenden, die ihr grundsätzliches Interesse bekundet hatten, meldeten sich schließlich genau 30 verbindlich an – und alle 30 traten am Ende auch tatsächlich die Reise nach Trapani an.

Von unseren sechs Projektgruppenmitgliedern reisten vier persönlich mit nach Trapani. Die beiden begleitenden Dozierenden waren, wie schon bei den Exkursionen der Vorjahre, Herr Prof. Dr. Pochmann als Ansprechpartner der Projektgruppe und Frau Tischer als interkulturelle Unterstützung.

Die Teilnehmenden kamen alle aus unserem eigenen Studienjahr, jedoch aus mehreren unterschiedlichen Studiengängen. Dies sehen wir als sehr positiv, da sich unsere Bemühungen somit über mehrere Fachrichtungen bemerkbar gemacht haben und wir einen großen Teil unseres Jahrgangs erreichen konnten. Außerdem stärkte diese Vermischung die Beziehung zwischen den verschiedenen Studiengängen unseres Jahrgangs.

3 Casa Vacanze Fardella

Für unsere Exkursion entschieden wir uns letztendlich für die Casa Vacanze Fardella Centrale in Trapani. Wie bereits in Abschnitt 2.1 erwähnt, hatten wir während der Vorbereitungsphase zunächst zwei Unterkünfte reserviert, um eine zusätzliche Sicherheit für die Gruppe zu haben: Neben der Casa Vacanze hatten wir auch das Agriturismo Duca di Castelmonte im Blick. Nach der Buchung der Casa Vacanze über Booking.com nahmen wir direkt Kontakt mit der Unterkunft auf – zunächst per E-Mail, anschließend telefonisch – und ließen uns bestätigen, dass unsere Reservierung für die gesamte Gruppe verbindlich auf unseren Namen eingetragen war. Erst nach dieser Bestätigung stornierten wir das Agriturismo.

Die Casa Vacanze war für 30 Studierende in neun Wohneinheiten vom 15. bis zum 19. Juni 2026 reserviert: fünf Zimmer für jeweils vier Personen, zwei Zimmer für jeweils drei Personen und zwei Zimmer für jeweils zwei Personen. Um die Zimmeraufteilung möglichst gut an die Wünsche der Teilnehmenden anzupassen, informierten wir die Studierenden am 11. Juni über die genaue Struktur der Unterkunft, sodass sie sich untereinander absprechen konnten, mit wem sie während der Reise zusammenwohnen wollten. Am 13. Juni stellten wir dann ein Google-Dokument zur Verfügung, in das die Teilnehmenden ihre gewünschte Zimmerbelegung eintragen konnten. So ließ sich die Zimmeraufteilung bereits vor der Anreise organisieren, unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche.

Auch nach der Reservierung blieben wir mit der Unterkunft in Kontakt. Die Mitarbeitenden unterstützten uns unter anderem mit Informationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und den Möglichkeiten, sich innerhalb der Stadt fortzubewegen. Am 14. Juni, einen Tag vor unserer Anreise, fragte die Unterkunft zudem die Namen und notwendigen persönlichen Angaben aller Reisenden an, damit der Check-in bereits im Voraus vorbereitet werden konnte und die Ankunft der 30 Teilnehmenden möglichst

schnell und unkompliziert verlief. Über denselben Kanal gaben wir den Teilnehmenden zu diesem Zeitpunkt auch die letzten organisatorischen Informationen weiter, einschließlich des finalen Programms.

Die zentrale Lage der Casa Vacanze war für uns ein entscheidender Grund für die endgültige Wahl, da sich dadurch viele Wege innerhalb von Trapani zu Fuß zurücklegen und zusätzliche Transfers teilweise vermeiden ließen. Der Gesamtpreis der Unterkunft betrug 4.920,00 € und wurde einige Tage vor der Anreise vom Konto unseres Professors abgebucht; hinzu kamen 360,00 € Kurtaxe, die vor Ort zu bezahlen war.

4 Durchführung

Montag, 15.06.2026: Anreise (Trapani)

Nach der Landung auf Sizilien nahmen wir gemeinsam Taxis, um vom Flughafen zu unserer Unterkunft in Trapani zu gelangen. Dort angekommen, erledigten wir den Check-in in der Casa Vacanze Fardella Centrale, sodass jede und jeder sein Zimmer beziehen und das Gepäck ablegen konnte.


Der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft schlug mit 9,25 € pro Person zu Buche, was bei der Gruppengröße Gesamtkosten von 277,50 € ergab. Da die Museen in Trapani am Montag geschlossen waren, ließen wir den restlichen Nachmittag bewusst frei. So konnten die Teilnehmenden sich nach der Anreise erst einmal erholen, die Umgebung der Unterkunft auf eigene Faust erkunden oder gemeinsam einen ersten Spaziergang durch die Altstadt unternehmen, bevor am Dienstag das eigentliche Programm begann.


EI-ENM









4.2 Dienstag, 16.06.2026: Salzunternehmen, Weingut / Erice

a. Vormittag Besuch des Salzunternehmens (Gesamtgruppe)

Der Dienstagvormittag stand im Zeichen unseres ersten Unternehmensbesuchs: Die gesamte Gruppe von 32 Personen besuchte gemeinsam ein Salzunternehmen südlich von Trapani. Laut Programm war die Abfahrt für 9:30 Uhr geplant, ein privater Shuttletransfer sollte uns dorthin bringen. Die Shuttles trafen jedoch bereits um 9:00 Uhr vor dem Hotel ein, was zu etwas Verwirrung führte, da nicht alle rechtzeitig informiert waren. Wir starteten schließlich gegen 9:15 Uhr mit mehreren Kleinbussen von Trapani aus und erreichten nach etwa einer halben Stunde Fahrt, kurz vor 10:00 Uhr, das Unternehmen.

Vor Ort wurden wir von einer Reiseleiterin empfangen, die uns auf Englisch durch die Anlage führte. Sie erklärte zunächst die Mechanismen der Salzgewinnung sowie die wirtschaftliche Bedeutung des Salzes für den regionalen Handel. Anschließend berichtete sie über die Geschichte des Betriebs: wie die Ernte früher ablief und wie sich das Unternehmen im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Ein besonderes Highlight war die Verkostung verschiedener Salzsorten, die wir zunächst probieren durften. Im Anschluss zeigte man uns auch, wie das Salz auf der Haut angewendet wird, da es in der Region traditionell auch als heilende und gesundheitsfördernde Substanz gilt.

Die geführte Tour, die vor allem innerhalb der Betriebsanlagen stattfand, endete gegen 11:30 Uhr und dauerte damit etwa eineinhalb Stunden. Im Anschluss hatten wir noch etwas Zeit für einen freien Rundgang über das Außengelände, bei dem wir die Salzbecken sowie das direkt angrenzende Meer aus der Nähe betrachten konnten – ein schöner Kontrast zu den eher technischen Erklärungen der Führung. Gegen Mittag traten wir mit denselben privaten Shuttles die Rückfahrt an und erreichten Trapani gegen 12:30 Uhr, wo die Mittagspause folgte.



a) Nachmittag: Weingut / Erice (geteilte Gruppe)


Am Nachmittag teilte sich die Gruppe: 17 Personen besuchten das Weingut, während die übrigen 15 Teilnehmenden nach Erice aufbrachen. Frau Tischer begleitete die Erice-Gruppe, während Herr Pochmann gemeinsam mit einem Mitglied der Organisationsgruppe zum Weingut fuhr; die drei übrigen vor Ort anwesenden Projektgruppenmitglieder schlossen sich der Erice-Gruppe an.

- **Erice**

Treffpunkt für die Erice-Gruppe war um 15:00 Uhr. Vor Ort genossen die Teilnehmenden den Nachmittag auf eigene Faust: Von der Stadt aus bewunderten sie den herrlichen Panoramablick über die Küste und besichtigten das mittelalterliche Castello di Venere. Am späteren Nachmittag kehrte die Gruppe nach Trapani zurück.





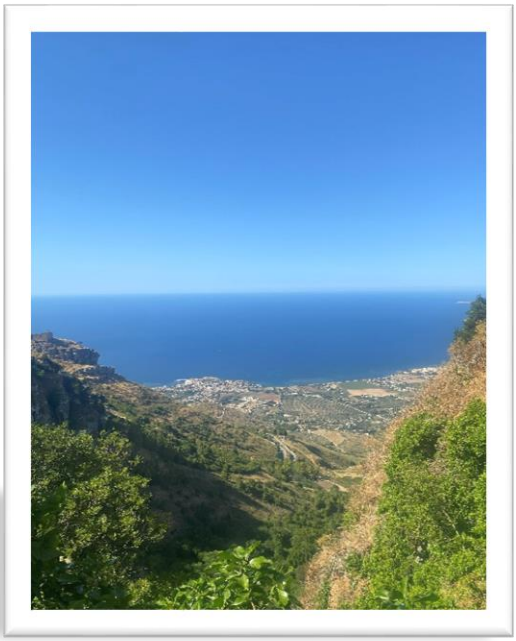




VISITA
ERICE
VISIT
ERICE


- **Weingut**


Für die Weingut-Gruppe war der Treffpunkt bereits um 14:00 Uhr am Bahnhof Trapani angesetzt. Der Zug fuhr um 14:38 Uhr ab, und die Gruppe erreichte Marsala kurz nach 15:00 Uhr. Von dort aus war noch ein etwa 20-minütiger Fußweg zum Weingut Curatolo Arini 1875 (Via Vito Curatolo Arini 5, 91025 Marsala TP, Italien) zurückzulegen, sodass die Ankunft zwischen 15:30 und 16:00 Uhr erfolgte.

Die Gruppe wurde von der Besitzerin empfangen, bevor ein Mitarbeiter die Führung auf Englisch übernahm. Er erläuterte die Geschichte des 1875 gegründeten, ursprünglich als Familienunternehmen geführten Weinguts sowie dessen Entwicklung über mehrere Generationen. Im Anschluss besichtigte die Gruppe die Produktions- und Lagerräume sowie die historischen Bereiche des Anwesens. Den Abschluss bildete eine Weinverkostung mit Rot-, Weiß- und Marsala-Wein, bei der jede und jeder alle drei Sorten probieren konnte.

Gegen 17:30 Uhr verließ die Gruppe das Weingut. Bis zur Rückfahrt blieb Zeit für einen freien Spaziergang durch Marsala, mit einer Pause in einer Bar oder an einem Imbisswagen. Der Zug brachte die Gruppe anschließend zurück nach Trapani, wo sie gegen 20:30 Uhr ankam.



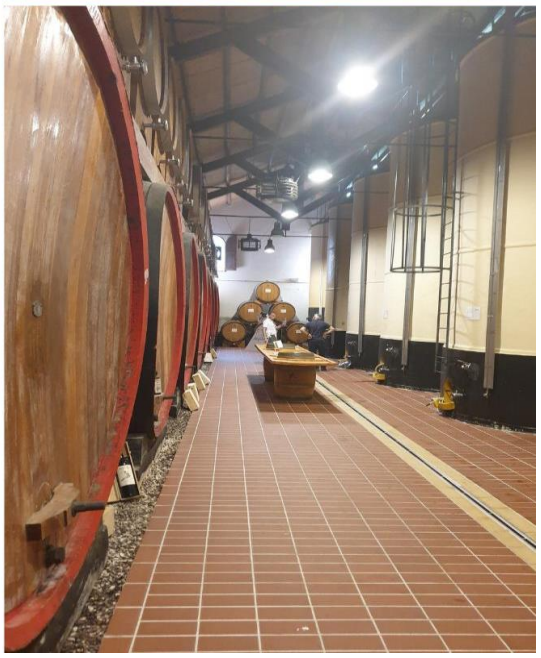

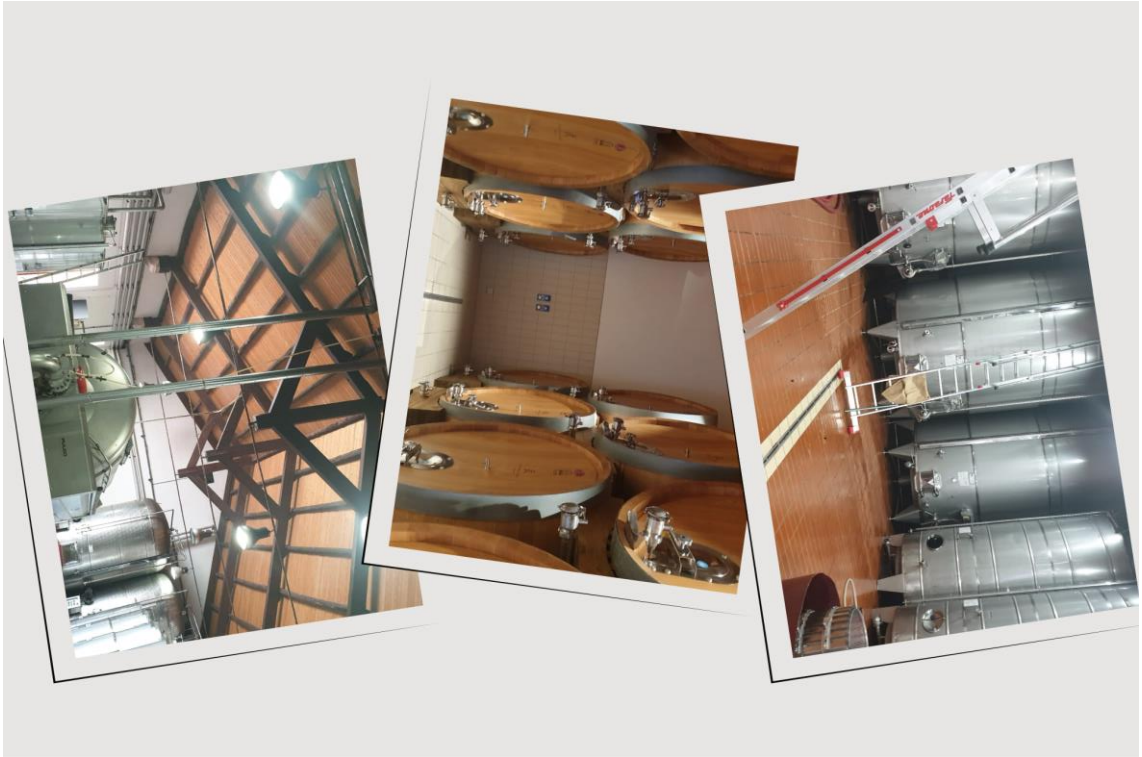4.3 Mittwoch, 17.06.2026: Exkursion nach Palermo (Palazzo dei Normanni)

Der Mittwoch war ganztägig einem Ausflug nach Palermo gewidmet, an dem alle 32 Teilnehmenden partizipierten. Treffpunkt für die gesamte Gruppe war um 8:50 Uhr vor dem Hotel in Trapani; der Bus fuhr kurz nach 9:00 Uhr ab. Nach knapp zwei Stunden Fahrzeit erreichten wir Palermo am späten Vormittag.

Zunächst hatten wir freie Zeit in der Stadt: Jede und jeder konnte auf eigene Faust umherschlendern, sich etwas zu essen suchen oder kleine Ecken der Stadt zu Fuß entdecken.

Der organisierte Programmpunkt des Tages war der Besuch des Palazzo dei Normanni im Zentrum von Palermo. Treffpunkt vor dem Eingang war um 14:30 Uhr; die Besichtigung erfolgte frei und ohne festen Guide, sodass wir den Palast in unserem eigenen Tempo erkunden konnten. Der Rundgang führte über mehrere Stockwerke und verband unterschiedliche Facetten: Zu Beginn stand eine kleine Ausstellung über künstlerische Strömungen des Impressionismus, anschließend besichtigten wir die jahrhundertealten Fundamente und die historischen Räumlichkeiten des Palastes. Ein besonderes Highlight war eine kleine Kapelle mit wunderschönen Fresken. Am Ende der Besichtigung konnten wir die Palastgärten frei erkunden – ein sehr schöner, deutlich naturnaherer


Abschluss des Rundgangs. Gegen 16:00 bis 16:30 Uhr endete der Besuch an einer kleinen Erfrischungsbude direkt vor Ort, wo wir noch etwas essen und trinken konnten.

Für die Rückfahrt hatten wir bereits im Voraus Busfahrkarten für alle gekauft und jeder Person am Vorabend individuell per E-Mail ihr Hin- und Rückfahrticket zugeschickt. Offiziell vorgesehen war für alle die Rückfahrt um 21:00 Uhr mit Ankunft in Trapani gegen 23:00 Uhr. Da es an diesem Tag jedoch sehr heiß war, entschieden sich viele Teilnehmende – die Organisatorin eingeschlossen –, früher zurückzufahren. Da die Busverbindungen zwischen Palermo und Trapani regelmäßig, etwa stündlich, verkehrten, ließen sich die Tickets unkompliziert online umtauschen. Ein großer Teil der Gruppe nahm so beispielsweise den Bus um 19:00 Uhr und war bereits gegen 21:00 Uhr zurück in Trapani. Andere nutzten den Nachmittag noch für einen Strandbesuch oder erkundeten weiter die Innenstadt von Palermo und kehrten wie ursprünglich geplant um 23:00 Uhr zurück. Insgesamt reiste damit etwa die Hälfte der Gruppe früher zurück als vorgesehen, während die andere Hälfte beim ursprünglichen Zeitplan blieb.







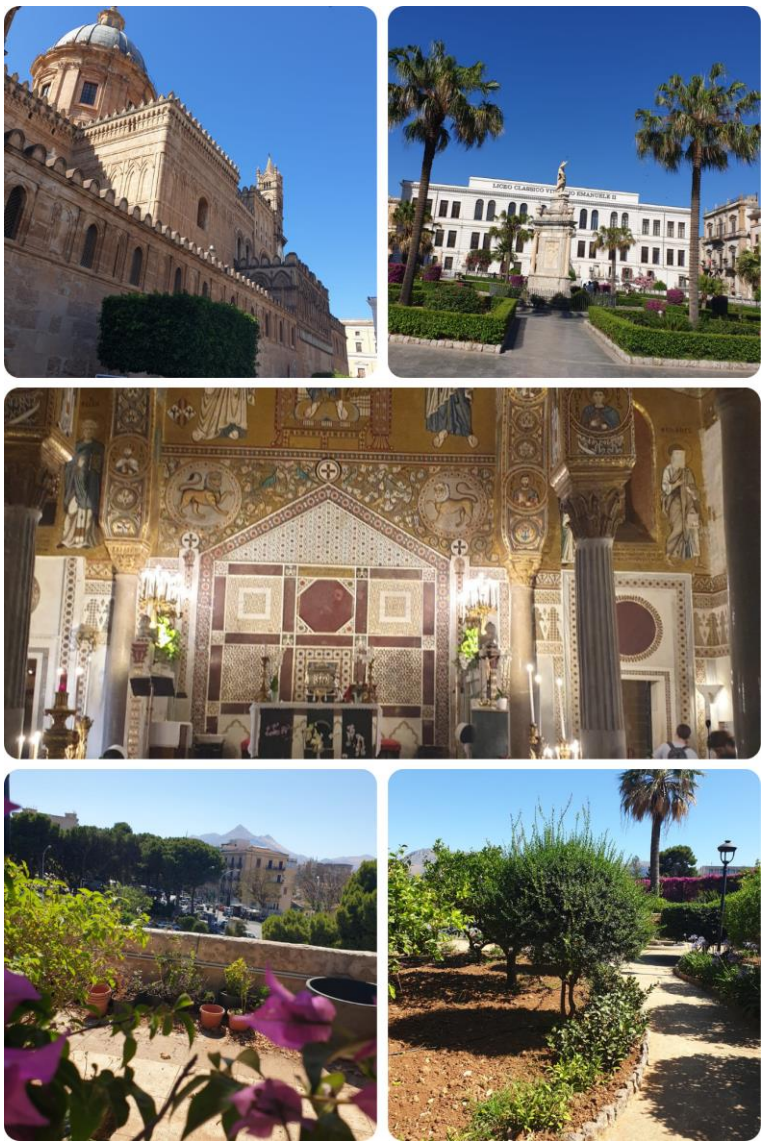

4.4 Donnerstag, 18.06.2026


Für den vorletzten Tag unserer Exkursion nach Trapani trafen wir uns um 8:30 Uhr vor unserem Hotel, um zum Hafen von Trapani zu gehen. Um 9:30 Uhr konnten wir an Board des Bootes gehen und die Fahrt begann. Das Wetter war sehr schön und wir hatten vom Boot aus einen wunderbaren Blick auf das Meer und die kleinen sizilianischen Inseln. Während der Fahrt wurden Informationen über die Inseln und die Geschichte Siziliens über Lautsprecher abgespielt.


Gegen 10:30 Uhr legte das Boot im Hafen der ersten Insel namens Favignana an. Wir hatten bis 12:30 Uhr Zeit, die Insel zu besichtigen oder schwimmen zu gehen. Favignana

ist eine relativ kleine, aber sehr schöne Insel. Am Hafen kann man Fahrräder leihen, und im Zentrum befinden sich kleine Restaurants sowie Souvenirläden. Zudem gab es einen Kieselstrand, an dem sich viele aus unserer Exkursionsgruppe ausruhten und badeten.

Nach zweistündigem Aufenthalt stiegen die Gruppe und die anderen Fahrgäste wieder ein, um die Fahrt fortzusetzen. Unterwegs hatten wir die Möglichkeit, mitten im Meer zu schwimmen. Danach machte sich unser Boot auf den Weg zur zweiten Insel Levanzo, wo wir eine Stunde lang bleiben konnten. Levanzo war wunderschön und das Wasser so klar, dass man die Fische sehen konnte.


Nach dieser kurzen Stunde stiegen alle wieder ein, um nach Trapani zurückzukehren. Dabei fuhren wir an den Faraglioni-Felsen sowie den Buchten Minnola und Fredda vorbei. Gegen 17:30 Uhr legten wir wieder im Hafen von Trapani an. Nach diesem langen Tag stand es allen frei, ins Hotel zurückzukehren oder den Rest des Abends individuell zu gestalten.

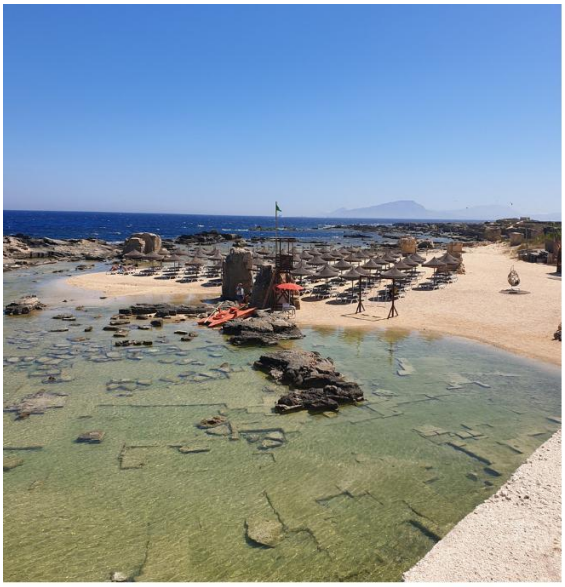

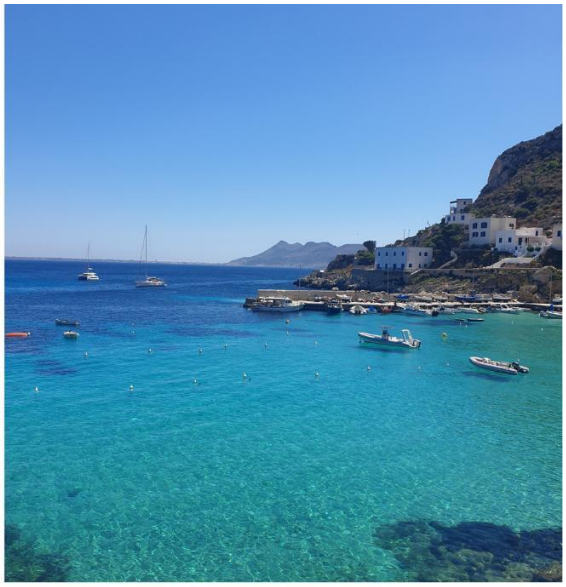





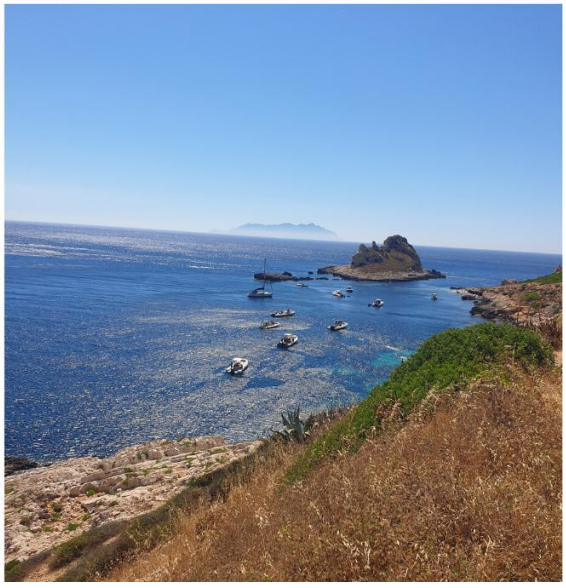



4.5 Freitag, 19.06.2026

Am letzten Tag stand um 10:00 Uhr der Checkout aus dem Hotel an: Bis dahin mussten alle ihr Gepäck gepackt und das Hotel verlassen haben. Dies verlief planmäßig, alle Teilnehmenden waren pünktlich mit ihrem Gepäck bereit.

Anschließend hatten die Teilnehmenden Zeit, sich frei in Trapani zu bewegen – für letzte Einkäufe, Verpflegung oder die Erkundung von Stadtteilen, die bis dahin noch nicht besucht worden waren, etwa die Bereiche jenseits des Hafens. Da nach dem Checkout kein Zugang mehr zum Hotel bestand, deponierten einige Teilnehmende ihr Gepäck an einem Ort in der Stadt und holten es erst kurz vor der Abfahrt wieder ab; andere behielten ihr Gepäck während der gesamten Zeit bei sich.

Der Treffpunkt für die gesamte Gruppe war um 15:15 Uhr vor dem Hotel. Private Shuttles brachten uns anschließend zum Flughafen Trapani-Birgi; die Abfahrt erfolgte um 15:30 Uhr, die Ankunft am Flughafen gegen 16:00 Uhr. Nach Gepäckabgabe und Kontrollen erfolgte der Rückflug, der planmäßig um 18:50 Uhr mit Ankunft in Saarbrücken um 21:10 Uhr vorgesehen war. Der Abflug verzögerte sich um rund 40 Minuten, sodass die Gruppe erst gegen 22:00 Uhr in Saarbrücken landete – mit einer Gesamtverspätung von etwa einer Stunde gegenüber der ursprünglichen Planung.









5 Nachbereitung

5.1 Umfrage mit Bewertung

Im Anschluss wurde eine systematische quantitative und qualitative Evaluation durchgeführt, um die Zufriedenheit der Studierenden zu erfassen und wertvolles Feedback für künftige Projekte zu gewinnen. Die Datenerhebung erfolgte digital über die Plattform Mokaform. Insgesamt nahmen zehn Teilnehmende an der Befragung teil und bewerteten die Exkursion.


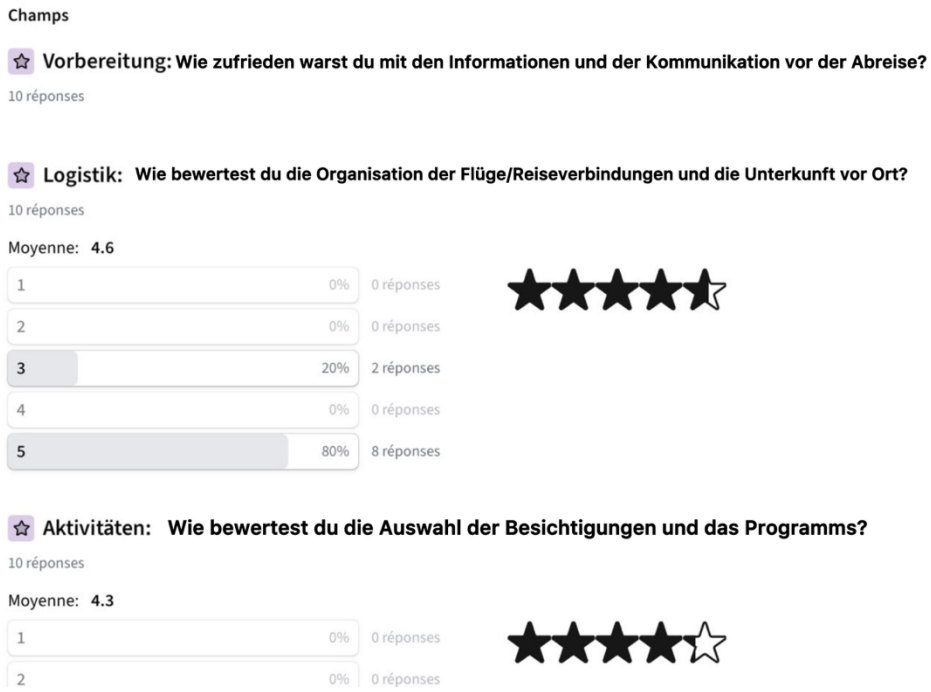


Abbildung 1 und Abbildung 2: Ergebnisse der Mokaform-Teilnehmerbefragung zu Logistik, Aktivitäten, Zeitmanagement, Dauer und Betreuung (Quelle: Eigene Darstellung via Mokaform)

Hinsichtlich des Zeitmanagements und der Programmstruktur zeigte sich die Gruppe außerordentlich zufrieden. Die Aufteilung zwischen dem offiziellen Hochschulprogramm mit Unternehmensbesuchen und Fachexkursionen und der zur Verfügung stehenden Freizeit erzielte einen herausragenden Mittelwert von 4,8 von 5 Sternen. Dabei vergaben 80 % der Befragten die volle Punktzahl von 5 Sternen, während die übrigen 20 % 4 Sterne vergaben. Die Balance zwischen fachlichen Inhalten und Erholungsphasen wurde somit von der großen Mehrheit als nahezu optimal empfunden.

Die organisatorische Leistung und die Betreuung vor Ort durch das studentische Projektteam wurden positiv bewertet und erreichten einen starken Notendurchschnitt von 4,1 von

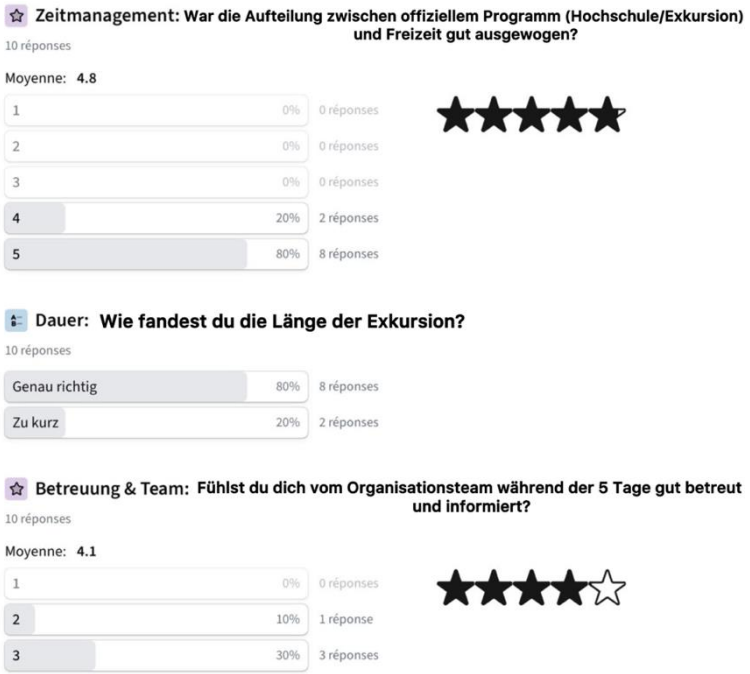

5 Sternen. Der Großteil der Rückmeldungen spiegelt eine verlässliche Begleitung und Ansprechbarkeit wider. Vereinzelte schwächere Bewertungen (darunter 30 % mit 3 Sternen und 10 % mit 2 Sternen) weisen jedoch auf leichtes Optimierungspotenzial im Bereich der Betreuung und internen Abstimmung hin. Bezüglich des zeitlichen Rahmens gaben 80 % der Befragten an, dass die Exkursionsdauer von fünf Tagen genau richtig bemessen war. Für die restlichen 20 % fiel die Reise hingegen zu kurz aus, während kein Teilnehmer den Zeitraum als zu lang empfand.

Die qualitative Auswertung der Freitextfelder lieferte zudem detaillierte Einblicke in die Wahrnehmung der einzelnen Programmpunkte sowie in die Arbeitsweise des Organisationsteams. Besonders begeistert waren die Teilnehmenden von den Exkursionen im Umland und auf dem Meer. Als absolute Highlights wurden von den Teilnehmenden die Bootsfahrt zu den Ägadischen Inseln beziehungsweise nach Favignana, der Tagesausflug nach Palermo sowie die Besichtigung des Weinguts in Marsala hervorgehoben. Im Gegensatz dazu lag der Fokus der Kritik hauptsächlich auf der Informationsweitergabe vor der Abreise. Es wurde vereinzelt angemerkt, dass die Vorab-Kommunikation unvollständig wirkte. So gab es beispielsweise keine Informationen zu Details zum Ablauf, zur Frühstücksregelung oder zu spezifischen Hinweisen für Studierende anderer Campus-Standorte. Außerdem wurde angeregt, die interne Abstimmung innerhalb des Organisationsteams künftig klarer zu strukturieren, um uneinheitliche Auskünfte an die Gruppe zu vermeiden.

5.2 Erkenntnisse für die Projektgruppe

Die Vorbereitung und Durchführung der Exkursion nach Trapani boten uns wertvolle Lernfelder, insbesondere in den Bereichen Kommunikation, Logistik und Flexibilität. Im Rückblick lassen sich die wesentlichen Erkenntnisse wie folgt zusammenfassen.

a. Interne und externe Kommunikation

Ein zentraler Ansatzpunkt für zukünftige Projekte liegt in der Optimierung der internen Kommunikation. Es zeigte sich, dass Absprachen innerhalb der Gruppe präziser hätten getroffen und Perspektiven der einzelnen Mitglieder stärker hätten berücksichtigt werden müssen. Durch mangelnde Abstimmung kam es vereinzelt dazu, dass widersprüchliche Informationen an die Exkursionsteilnehmer weitergegeben wurden.

Darüber hinaus offenbarte die Programmplanung logistische Lücken, die durch eine gründlichere Vorabprüfung hätten vermieden werden können: So entfiel der geplante Museumsbesuch am ersten Tag kurzfristig, da die Schließzeiten im Vorfeld nicht rechtzeitig bemerkt wurden. Für künftige Exkursionen empfiehlt es sich zudem, die Teilnehmenden bereits frühzeitiger und aktiver in die Ideen- und Stadtauswahl einzubeziehen, um deren Interessen noch besser abbilden zu können.

b. Logistische Herausforderungen der Standortwahl

Die Wahl eines kleineren Exkursionsziels wie Trapani brachte spezifische infrastrukturelle Hürden mit sich. Wie bereits im Vorfeld von Herrn Pochmann/der Exkursionsleitung angemerkt, gestaltet sich die Programm- und Logistikplanung in kleineren Städten deutlich komplexer als in Metropolen. Dies wurde besonders bei der Unterkunftssuche deutlich, da nur sehr wenige Hotels vor Ort die Kapazitäten besaßen, eine Gruppe von 30 Personen geschlossen unterzubringen.

Zusätzlich stellte die Sprachbarriere eine Herausforderung dar: Da vor Ort viele Menschen kein Englisch sprachen, war die Kommunikation teilweise eingeschränkt, was bei der Programmgestaltung und den Wegen vor Ort einkalkuliert werden muss.

c. Budgetierung und Kostenplanung

Aufgrund der Vorgaben der neuen Exkursionsordnung gestaltete sich auch die Finanzplanung als organisatorische Herausforderung. Die Erfahrung zeigte, dass eine exakte Punktlandung bei den Endabrechnungen kaum realisierbar ist. Für zukünftige Planungen ist es daher unerlässlich, sich von Beginn an auf gewisse budgetäre Abweichungen einzustellen und finanzielle Puffer flexibler einzuplanen. In unserem Fall ist beispielsweise der Museumsbesuch, welcher für Montag, den 15.06., geplant war, weggefallen, da wir uns im Voraus nicht gründlich genug über die Öffnungszeiten informiert haben. Dies ging auf Kosten der Teilnehmer, da eine Rückerstattung nicht möglich war.

5.3 Finanzielle Übersicht

a. Vorgaben der Hochschule

Die finanzielle Planung hat sich dieses Jahr unterschiedlich zu jener der Vorjahre gestaltet. Aufgrund einer neuen Regelung der Exkursionsordnung konnte die Hochschule von nun an keine Rückzahlungen mehr an die Teilnehmer leisten.

Um die Kosten der Exkursion so genau wie möglich decken zu können, wurden darauf basierend dieses Jahr zwei Zahlungen seitens der Teilnehmer geleistet.

Außerdem übernahm die Hochschule auch dieses Jahr 50% der Kosten. Noch dazu wurde von Herrn Pochmann zu Beginn 16.000,00 € als Gesamtlimit für die ganze Exkursion gesetzt.

b. Im Voraus geleistete Zahlung

Am 27.04.2026 wurden die Teilnehmenden dazu aufgefordert eine Anzahlung in Höhe von 185,00 € zu leisten. Diese Summe ergab sich aus 70% der damaligen geschätzten

Gesamtkosten, welche sich zu dieser Zeit auf 264,00 € ohne Zuschüsse beliefen. Zu diesem Zeitpunkt standen nur die Kosten für die Unterkunft fest.

c. Restzahlung

Die ausstehende Zahlung in Höhe von 65,00 € wurde am 07.06.2026 von den Teilnehmern verlangt, nachdem auch die Flüge gebucht wurden und das Programm verfeinert wurde. Die Zahlung wurde damit ein paar Tage später als geplant an die Teilnehmer getragen, da es Unstimmigkeiten innerhalb der Projektgruppe bezüglich des Betrages gab. Das Problem bestand darin, dass manche Programmpunkte bis zu diesem Tag noch geschätzte Beträge waren. Da die Hochschule eben keine Rückzahlungen mehr veranlasst, musste so präzise wie möglich abgeschätzt werden. Die Eigenanteile an den Exkursionskosten beliefen sich somit insgesamt auf 250,00 € pro studentischen Teilnehmer.

d. Kostenaufteilung

Im Folgenden befindet sich eine Illustrierung der tatsächlich angefallenen Kosten. Alle Kosten pro Person beziehen sich auf die durchschnittlich angefallenen Kosten eines Teilnehmenden (ohne Dozenten). Die Gesamtkosten beziehen sich auf die summierten Kosten aller 30 Teilnehmenden. Alle Angaben sind in Euro.

Kosten für Flug und Unterkunft

Kostenart	Kosten pro Person	Gesamtkosten
Flug	175,64	5269,25
Unterkunft (inkl. Kurtaxe)	176,00	5.280,00
Summe	351,64	10.549,25

Kosten für Transport und Programm vor Ort

Datum	Kostenart	Kosten p. P.	Gesamtkosten
Montag, 15.06.	Shuttle vom Flughafen zur Unterkunft	9,25	277,50
Dienstag, 16.06.	Transport Unternehemensbesichtigung (Hin- und Rückweg)	15,00	450,00

	Besichtigung Salinen	9,00	270,00
	Erice (13 Personen)	15,00	195,00
	Weingutsbesichtigung (17 Personen)	20,00	340,00
	Transport Weingut (17 Personen)	6,4	108,80
Mittwoch, 17.06.	Transport Palermo (Hin- und Rückfahrt)	19,20	576,00
	Palazzo Palermo	14,50	430,78
Donnerstag, 18.06.	Bootsfahrt	45,00	1.350,00
	Abgabe Meeresschutz	5,00	150,00
Freitag, 19.06.	Shuttle zum Flughafen	9,25	277,50
Summe		167,60	4.425,58

Geleistete Zahlungen der Teilnehmer

Zahlungsart	Zahlung p. P.	Gesamtsumme
Anzahlung	185,00	5.550,00
Restzahlung	65,00	1.950,00
Summe	250,00	7.500,00

Differenz zwischen geleisteten Zahlungen und tatsächlich angefallenen Kosten

Kosten-/Zahlungsart	Pro Person	Gesamtsumme
Zahlungen	250,00	7.500,00
Tatsächliche Kosten	259,62	7.788,6
Differenz	9,52	285,60

Schlusswort

Die Organisation und Durchführung der Exkursion nach Trapani war für uns als Projektgruppe eine wertvolle praktische Erfahrung. Von der ersten Abstimmung über das Reiseziel bis zur konkreten Planung von Flug, Unterkunft, Aktivitäten, Transport und Teilnehmerkommunikation mussten zahlreiche Entscheidungen getroffen und miteinander abgestimmt werden. Dabei konnten wir die im Studium behandelten Inhalte des Projektmanagements auf ein reales Projekt anwenden und gleichzeitig lernen, wie wichtig eine strukturierte Vorbereitung und eine klare Aufgabenverteilung für die Organisation einer Gruppenreise sind.

Besonders wichtig war für uns, die unterschiedlichen Interessen der Teilnehmer mit den organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen zu verbinden. Durch die verschiedenen Umfragen konnten wir die Studierenden bereits bei der Wahl des Reiseziels und bei der Gestaltung des Programms einbeziehen. Gleichzeitig mussten wir darauf achten, dass die geplanten Aktivitäten, die Teilnehmerzahl, die Unterkunft, die Transportmöglichkeiten und das verfügbare Budget miteinander vereinbar waren.

Während der Vorbereitung wurde uns außerdem deutlich, dass eine Exkursion dieser Größe nicht nur aus der Planung einzelner Aktivitäten besteht. Viele organisatorische Aufgaben laufen parallel und können sich gegenseitig beeinflussen. Eine Änderung bei einer Reservierung kann beispielsweise Auswirkungen auf den Transport, die Kosten oder den Ablauf des Programms haben. Dadurch haben wir gelernt, flexibler zu planen, regelmäßig Rücksprache zu halten und wichtige Entscheidungen möglichst frühzeitig abzusichern.

Auch die Zusammenarbeit innerhalb unserer Projektgruppe war ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Die gemeinsame Organisation erforderte regelmäßige Absprachen, eine zuverlässige Kommunikation und die Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen und sich gegenseitig zu unterstützen. Gleichzeitig konnten wir durch die verschiedenen organisatorischen Situationen feststellen, welche Vorgehensweisen gut funktioniert haben und an welchen Punkten wir unsere Arbeitsweise bei einem zukünftigen Projekt noch verbessern könnten.

Insgesamt betrachten wir die Exkursion nicht nur als eine Reise, sondern vor allem als ein gemeinsames Projekt, bei dem wir Erfahrungen in der Planung, Organisation, Kommunikation und Durchführung sammeln konnten. Neben den fachlichen und organisatorischen Aspekten war es uns wichtig, den Teilnehmern eine abwechslungsreiche und angenehme Woche zu ermöglichen. Die abschließende Bewertung der Exkursion gilt für

uns als Projektgruppe somit als gelungen, auch wenn hier und da ein paar „Patzer“ passiert sind.
